

安威川ダム建設事業に関する取組状況について

- 1 安威川ダム建設事業について（平成 29 年 12 月末現在）
- <進捗状況等について>
- ① ダム本体工事等

・大阪府において、平成 33 年度末のダム完成（供用開始は平成 35 年度）に向けて、本体工事を施工中。

・平成 28 年度に右岸側の基礎掘削工事は概ね完了。引き続き、左岸側の基礎掘削を実施しており、平成 30 年春頃に完了予定。

・また、平成 29 年 7 月からコア材採取地（大岩地区）からコア材の運搬を実施中。あわせて、掘削が完了した所から、ロック材の盛立工事を実施。

・平成 29 年 10 月からダムの基礎岩盤にある水みちを塞ぐための止水対策（基礎処理）を実施中。

・ダム貯水池の水を取水・放流するための常用洪水吐きのトンネル掘削工事を平成 29 年 11 月から実施中。
- ② 左岸道路（全長 3.3km）

・左岸道路の北側（約 800m）は、平成 24 年 9 月に供用開始。

・残区間（約 2,500m）については、平成 32 年度での全線供用に向けて、橋梁工事等を継続して実施中。
- ③ 圃場整備事業

・桑原地区は整備完了、平成 23 年 4 月から全面営農開始。


・大岩地区で実施中のダム建設残土による盛土工事は、平成 30 年度末に概成予定。

・平成 33 年春の営農開始に向けて、ため池築造工事の実施と上面整備工事（圃場整備）を実施中。

2 水源地域整備計画事業（平成 29 年度茨木市実施分）について ※下図参照

事業名	内容等
①車作地区土地改良事業（一越キ）	水路・農道工事、ため池工事
②安威川ダム周辺整備制度設計等検討業務委託	「3 安威川ダム周辺整備について」のとおり
③スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設	権内せせらぎ公園（車作地区）のアクセス道路となる車作 1 号線の測量設計
④大岩 9 号線整備事業（大阪府から本市へ委託）	橋梁上部・下部工事等

水源地域整備計画事業（茨木市実施分）実施箇所図

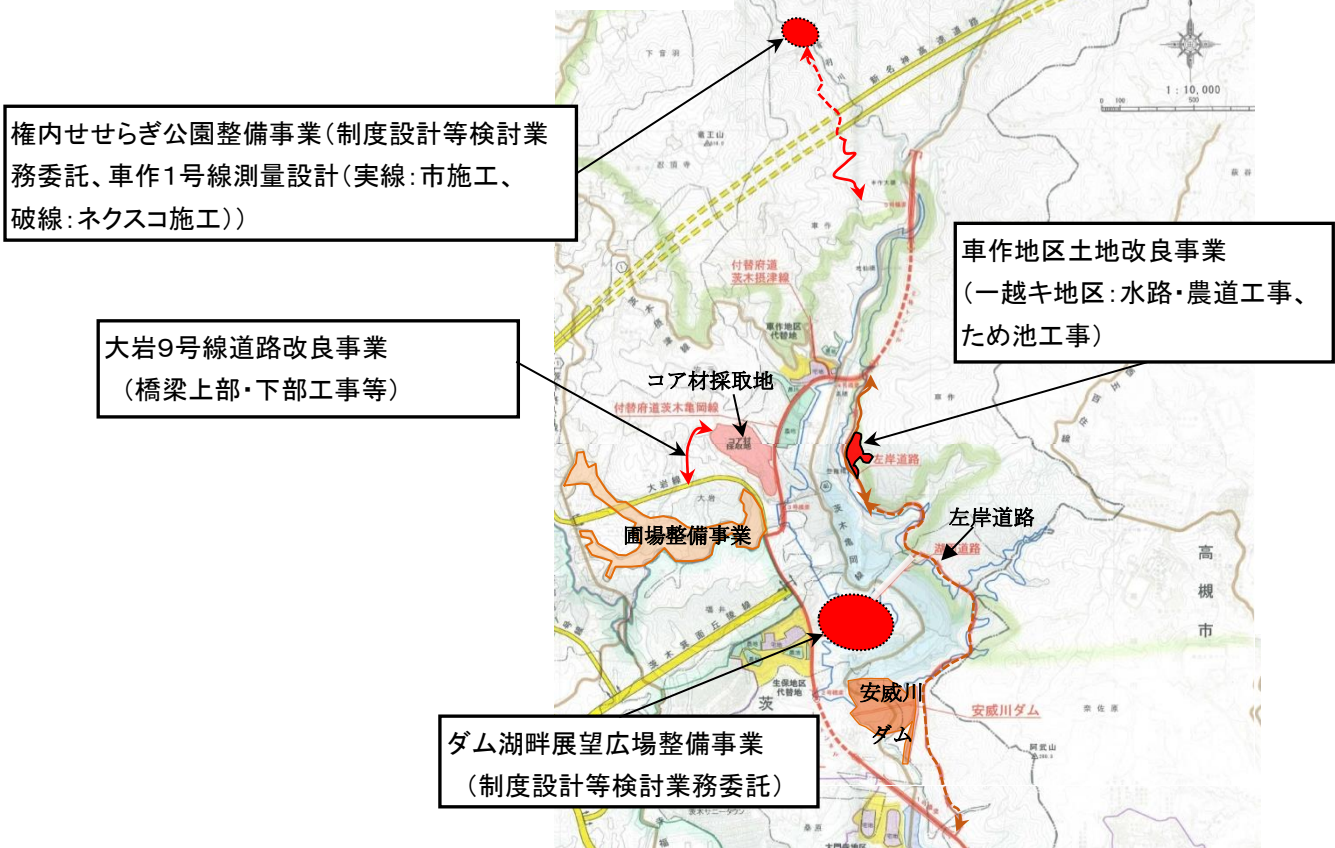

【本体工事及び関連工事等のスケジュール（予定）】

年 度		2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4～
ダム本体工事		基礎掘削		コア材採取・運搬			
				基礎処理・堤体盛立			試験湛水・供用開始
ダム関連 工事	左岸道路						
	圃場整備事業（大岩）		盛土・上面整備・ため池築造		営農再開		
水源地域 整備計画 事業	車作地区土地改良事業 （一越キ）						
	車作 1 号線						
	大岩 9 号線（圃場区域外）						

3 安威川ダム周辺整備について

- ① 平成 28 年度調査において、周辺整備に関心を示す民間事業者を中心に、周辺整備の基本構想（案）作成の参考とするためヒアリングを実施中。

【ヒアリングでの主な説明内容（資料 4 参照）】

○対象範囲

ダム事業区域内：湖面（約 30ha）、平坦地複数箇所（合計約 5 ha）

ダム事業区域外：地域振興拠点ゾーン（ダム湖展望広場を含む（約 6 ha））、権内せせらぎ公園（約 0.4ha）

○事業スキーム

必要な施設の整備、運営は民間事業者が実施。用地取得（事業区域外）、インフラ整備等は市で実施

ダム事業区域内：河川法の適用範囲内での活用を検討

ダム事業区域外：市が用地を取得し、民間事業者に貸し付ける手法を想定

- ② ヒアリングの状況
- ・アウトドア系、飲食、物販、アトラクション系の複数事業者が、本市と継続的なヒアリングを希望。

・また、民間事業者との意見交換を通し、周辺整備事業に対して様々なアイデアや意見を把握するため、国土交通省と内閣府が実施するプラットフォームを活用したサウンディング調査に参加予定。
- ③ 今後、民間事業者のヒアリング内容や測量結果を踏まえた概略の造成検討をもとに、周辺整備のコンセプトや対象範囲、整備方針、事業手法などを含めた『安威川ダム周辺整備基本構想（案）』を平成 29 年度内を目標に作成する。その後、市議会、関係地区へ説明・報告するとともに有識者の意見を聴きながら、平成 30 年 9 月を目標に基本構想をとりまとめる。

【経過とスケジュール】

平成 29 年 4 月～	民間事業者への説明内容の整理（ダム事業区域内の活用条件など）
平成 29 年 10 月～	民間事業者とのヒアリング開始
平成 30 年 2 月	サウンディング調査へ参加（国土交通省、内閣府主催）
平成 30 年 3 月（予定）	安威川ダム周辺整備基本構想（案）作成
～ 市議会・関係地元へ説明・報告、有識者意見聴取 ～	
平成 30 年 9 月（予定）	安威川ダム周辺整備基本構想とりまとめ
平成 30 年度～（予定）	事業者公募開始

安威川ダム周辺整備基本方針（平成21年8月）で定めたゾーニング（一部）

